

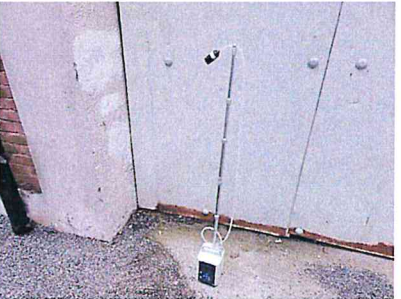
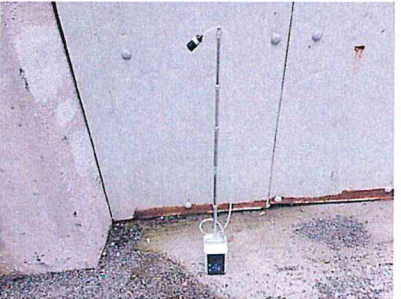
1. 측정결과 - 2024. 01. 31. 사전 측정

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 4대	#1	부지경계선1	9.92	245	0.0014	N/A
	#2	부지경계선2	9.94	245	0.0016	N/A
	#3	부지경계선3	9.91	245	0.0016	N/A
	#4	부지경계선4	9.90	245	0.0014	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 4대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0014
	측정 시작 시간 09:09	측정 종료 시간 13:14	
부지경계선2			0.0016
	측정 시작 시간 09:10	측정 종료 시간 13:15	
부지경계선3			0.0016
	측정 시작 시간 09:12	측정 종료 시간 13:17	
부지경계선4			0.0014
	측정 시작 시간 09:13	측정 종료 시간 13:18	

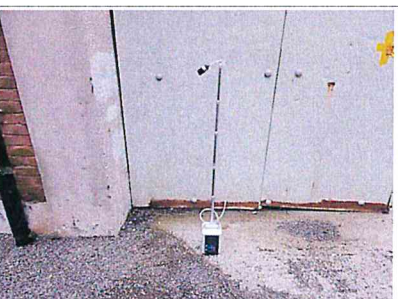
1. 측정결과 - 2024. 02. 01.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 4대, SARA-5100 / 2대	#1	부지경계선1	9.94	245	0.0018	N/A
	#2	부지경계선2	9.94	245	0.0020	N/A
	#3	부지경계선3	9.94	245	0.0020	N/A
	#4	부지경계선4	9.91	245	0.0020	N/A
	#5	위생설비입구	9.90	45	0.0048	N/A
	#6	음압기공기배출구1	9.92	45	0.0037	N/A
	#7	음압기공기배출구2	9.96	45	0.0040	N/A
	#8	음압기공기배출구3	9.94	45	0.0037	N/A
	#9	음압기공기배출구4	9.94	45	0.0037	N/A
	#10	음압기공기배출구5	9.90	45	0.0040	N/A
	#11	폐기물반출구	9.97	45	0.0044	N/A
	#12	폐기물보관지점1	9.94	45	0.0037	N/A
	#13	폐기물보관지점2	9.93	45	0.0037	N/A

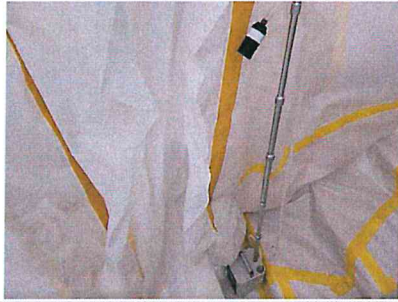
- 작업장주변(실외)는 부지경계선이 대상 건축물 5m 이내이므로 측정하지 않음.
- 작업장주변(실내)는 사용자가 없으므로 측정하지 않음.
- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 4대, SARA / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0018
	측정 시작 시간 09:04	측정 종료 시간 13:09	
부지경계선2			0.0020
	측정 시작 시간 09:05	측정 종료 시간 13:10	
부지경계선3			0.0020
	측정 시작 시간 09:08	측정 종료 시간 13:13	
부지경계선4			0.0020
	측정 시작 시간 09:09	측정 종료 시간 13:14	
위생설비 입구			0.0048
	측정 시작 시간 09:14	측정 종료 시간 09:59	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
음압기공기 배출구1			0.0037
	측정 시작 시간 09:16	측정 종료 시간 10:01	
음압기공기 배출구2			0.0040
	측정 시작 시간 10:16	측정 종료 시간 11:01	
음압기공기 배출구3			0.0037
	측정 시작 시간 10:17	측정 종료 시간 11:02	
음압기공기 배출구4			0.0037
	측정 시작 시간 11:38	측정 종료 시간 12:23	
음압기공기 배출구5			0.0040
	측정 시작 시간 11:39	측정 종료 시간 12:24	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 반출구			0.0044
	측정 시작 시간 13:19	측정 종료 시간 14:04	
폐기물 보관지점1			0.0037
	측정 시작 시간 15:29	측정 종료 시간 16:14	
폐기물 보관지점2			0.0037
	측정 시작 시간 15:30	측정 종료 시간 16:15	

1. 측정결과 - 2024. 02. 02.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 4대, SARA-5100 / 4대	#1	부지경계선1	9.94	245	0.0020	N/A
	#2	부지경계선2	9.92	245	0.0020	N/A
	#3	부지경계선3	9.90	245	0.0018	N/A
	#4	부지경계선4	9.97	245	0.0022	N/A
	#5	위생설비입구	9.93	45	0.0048	N/A
	#6	음압기공기배출구1	9.94	45	0.0037	N/A
	#7	음압기공기배출구2	9.90	45	0.0040	N/A
	#8	음압기공기배출구3	9.95	45	0.0040	N/A
	#9	음압기공기배출구4	9.91	45	0.0037	N/A
	#10	음압기공기배출구5	9.93	45	0.0040	N/A
	#11	폐기물반출구	9.92	45	0.0051	N/A
	#12	폐기물보관지점1	9.97	45	0.0040	N/A
	#13	폐기물보관지점2	9.95	45	0.0037	N/A

- 작업장주변(실외)는 부지경계선이 대상 건축물 5m 이내이므로 측정하지 않음.
- 작업장주변(실내)는 사용자가 없으므로 측정하지 않음.
- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 4대, SARA / 4대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0020
	측정 시작 시간 09:00	측정 종료 시간 13:05	
부지경계선2			0.0020
	측정 시작 시간 09:01	측정 종료 시간 13:06	
부지경계선3			0.0018
	측정 시작 시간 09:03	측정 종료 시간 13:08	
부지경계선4			0.0022
	측정 시작 시간 09:04	측정 종료 시간 13:09	
위생설비 입구			0.0048
	측정 시작 시간 09:11	측정 종료 시간 09:56	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
음압기공기 배출구1			0.0037
	측정 시작 시간 09:15	측정 종료 시간 10:00	
음압기공기 배출구2			0.0040
	측정 시작 시간 09:18	측정 종료 시간 10:03	
음압기공기 배출구3			0.0040
	측정 시작 시간 09:19	측정 종료 시간 10:04	
음압기공기 배출구4			0.0037
	측정 시작 시간 10:12	측정 종료 시간 10:57	
음압기공기 배출구5			0.0040
	측정 시작 시간 10:13	측정 종료 시간 10:58	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 반출구			0.0051
	측정 시작 시간 13:27	측정 종료 시간 14:12	
폐기물 보관지점1			0.0040
	측정 시작 시간 15:31	측정 종료 시간 16:16	
폐기물 보관지점2			0.0037
	측정 시작 시간 15:31	측정 종료 시간 16:16	

1. 측정결과 - 2024. 02. 03.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.92	45	0.0037	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.94	45	0.0033	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대				
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1				0.0037
	측정 시작 시간 09:04		측정 종료 시간 09:49	
부지경계선2				0.0033
	측정 시작 시간 09:04		측정 종료 시간 09:49	

1. 측정결과 - 2024. 02. 04.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 2대	#1	폐기물보관지점1	9.93	45	0.0033	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.92	45	0.0029	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1				0.0033
	측정 시작 시간 09:01		측정 종료 시간 09:46	
부지경계선2				0.0029
	측정 시작 시간 09:01		측정 종료 시간 09:46	

1. 측정결과 - 2024. 02. 05. 폐기물상차

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
- / -	#1	부지경계선1	-	-	-	-
	#2	부지경계선2	-	-	-	-
	#3	부지경계선3	-	-	-	-
	#4	부지경계선4	-	-	-	-
	#5	폐기물보관지점1	-	-	-	-
	#6	폐기물보관지점2	-	-	-	-

- 부지경계선1~4, 폐기물보관지점1~2는 우천으로 인해 측정불가.
- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하
